

Tag 1: Der Erdaushub für den Pool kann beginnen



Tag 2: Einbau Bodenablauf und einbringen der Sauberkeitsschicht $d = 6\text{ cm}$



Tag 3: Vorbereitung, Montage und betonieren der Bodenplatte



Tag 3 7:30 Uhr: Autokran ist zugbereit



Tag 3 7:30 Uhr: Montage Wand 1 und 2





SPÜRGIN
Betonfertigteile



Tag 3

7:50 Uhr: Montage der Wand 3 und 4



Tag 3

8:20 Uhr: Montage der Wand 5, gleichzeitig wird die Bodenplattenbewehrung und der Pumpenschacht eingebaut



Aufbiegen der Bewehrungsanschlüsse



Tag 3

8:40 Uhr: Montage Wand 6





SPÜRGIN
Betonfertigteile



Tag 3

9:00 Uhr: Montage Wand 7 und 8





SPÜRGIN
Betonfertigteile



Tag 3

9:30 Uhr: Montage Wand 9



Tag 3

9:50 Uhr: Montage Schachtdeckel und Weiterverlegung der Bodenplattenbewehrung





Tag 3

11:00 Uhr: Einbringen der Bodenplattenbewehrung abgeschlossen





Tag 3

11:30: Uhr Betonieren Bodenplatte und Pumpenkammer





SPÜRGIN
Betonfertigteile





SPÜRGIN
Betonfertigteile



Tag 4: Verlegung der Rohre für Düsen, Abwasser und Licht; Einbau von Rollkies, abschalen des Poolrandes und der Pooltreppe einschließlich bewehren.





SPÜRGIN
Betonfertigteile




- Tag 5: Betonieren des Poolrandes als auch der Pooltreppe
- Tag 6 / 7: Montage der Filteranlage, Salzanlage, Gegenstromanlage, Stromverteiler und Schachtdeckel; ausschalen der Randabschalung und der Treppe, Spachtelung der Fugen und Montage der Hülsen
- Tag 8 / 9: Verlegung der Folie, Vorbereitung für den Rollrasen
- Tag 10 / 11: Verlegung der Randplatten, Außenplatten und Einbau der Skimmerdeckel und Verteilerdosen, anbringen der Silikonfugen zwischen Folie und Randplatte





SPÜRGIN
Betonfertigteile

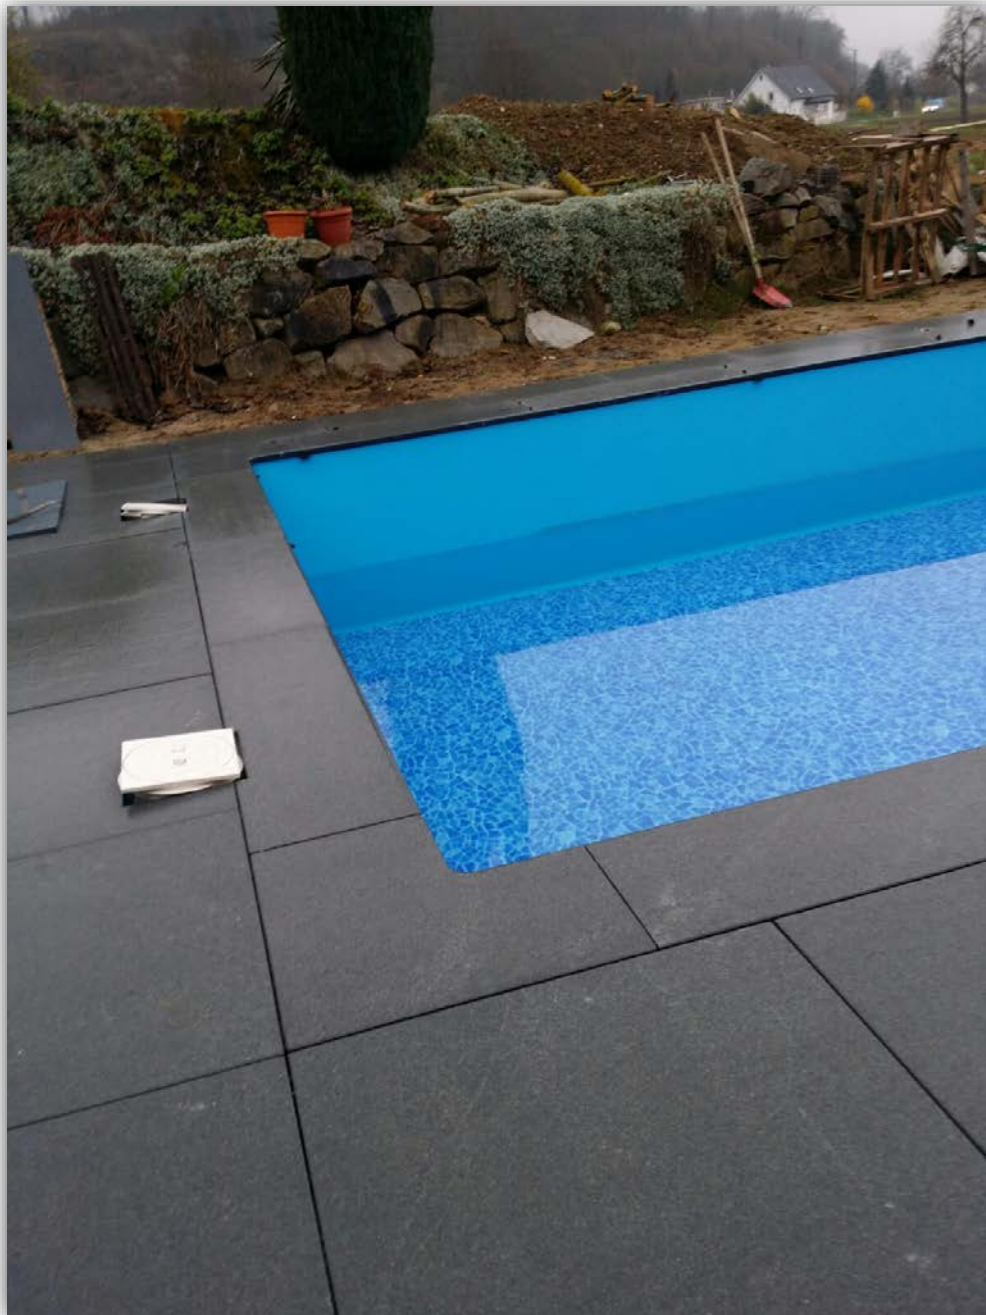

Tag 12: Verlegung des Rollrasens





Tag 13 Inbetriebnahme des Pools





Tag 13 Genießen

